

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE XICOTEPEC DE JUÁREZ
UTXJ
ING. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN ÁREA
ENTORNOS VIRTUALES Y NEGOCIOS DIGITALES
NOVENO CUATRIMESTRE GRUPO "A"



PROYECTO: IKAL

Gestión de proyectos

Ikal es una iniciativa de innovación social y comercial, creada para empoderar a los artesanos de Xicotepec de Juárez y Pantepec.

Integrantes:

KARLA YULENNI DOMÍNGUEZ AMADOR 230284
MARIA DEL ROSARIO MALDONADO HILARIO 230438
MARIA DE LOS ANGELES GARCIA CORTEZ 230538

Docente:

M.C.C. GLENDY MARISOL PERERA GÓNGORA

Contenido

Metodología Design Thinking + Gestión Ágil del Proyecto (Scrum)	2
FASE 1	3
EMPATIZAR	3
FASE 2	4
DEFINIR	4
FASE 3	5
IDEAR	5
FASE 4	7
PROTOTIPAR	7
FASE 5	8
EVALUAR	8
GESTIÓN ÁGIL DEL PROYECTO — SCRUM	9
1. Visión y Priorización del Product Backlog (WSJF / ROI / MoSCoW)	9
2. Arquitectura del Sprint Backlog (Capacidad y Estimación)	10
3. Ejecución Técnica y Gestión en Jira (Plan de Acción / Control de Versiones)	11
4. Gráficas de Control: Burndown Chart	12
5. Incremento de Producto y Reporte de Revisión (Sprint Review)	14

IKAL

Alma Artesanal

Marketplace de bordados artesanales de Xicotepec de Juárez, Puebla

Metodología Design Thinking + Gestión Ágil del Proyecto (Scrum)

Integrantes	Rol	Épicas asignadas
Karla Yulenni Domínguez Amador	Product Owner	EP-4 Comunidad y Difusión
María de los Ángeles García Cortez	Desarrolladora Frontend	EP-1 Registro · EP-2 Catálogo
María del Rosario Maldonado Hilario	Desarrolladora Full Stack	EP-1 Registro · EP-2 Catálogo · EP-3 Pagos

FASE 1

EMPATIZAR

A. Investigación de campo y contexto

Método de acercamiento:

- Observación directa del proceso de venta de artesanías en Xicotepec de Juárez, Puebla.
- Entrevistas informales con artesanas sobre sus canales de venta actuales y principales dificultades.

Hallazgos clave:

- Las y los artesanos entrevistados indican que no es conveniente la ayuda de intermediarios debido a que las ganancias que obtienen por mayoreo son muy pocas.
- Los intermediarios retienen entre el 40% y el 60% del precio final de cada pieza.
- Las artesanas no cuentan con presencia digital ni acceso directo a compradores fuera de su región.
- Los bordados de Xicotepec tienen alta demanda en ciudades como CDMX, Monterrey y Guadalajara, pero sin canal directo de distribución.
- Las artesanas desconocen el precio real al que se venden sus piezas al comprador final.

B. Usaria María Luisa Morales Sampayo — Artesana de Xicotepec

Etapas	Acción	Estado emocional	Punto de dolor
1. Producción	La artesana borda piezas a mano, invirtiendo días o semanas por pieza.	<i>Orgullosa y esperanzada</i>	Sus clientes buscan bajar los precios sin tomar en cuenta el tiempo y material que invierte la artesana.
2. Búsqueda de comprador	Acude a intermediarios locales o espera clientes en ferias regionales.	<i>Ansiosa, dependiente</i>	El intermediario impone el precio y se queda con la mayor ganancia.
3. Negociación (Punto bajo)	Acepta el precio del intermediario por necesidad económica.	<i>Frustrada, resignada</i>	No tiene alternativa. No conoce el precio real al que llegará su pieza.
4. Venta (Punto crítico)	La pieza se vende a precio muy superior en mercados urbanos o en línea.	<i>Sin información</i>	La artesana nunca conoce al comprador ni recibe retroalimentación.

C. Benchmarking de plataformas existentes

Plataforma	Fortalezas	Limitaciones (Oportunidad IKAL)
Etsy	Alcance internacional, marketplace consolidado.	Comisiones + tarifas. Interfaz en inglés. No enfocada en artesanas mexicanas.
Mercado Libre	Enorme alcance en México, pagos seguros.	No especializado en artesanías. Piezas únicas se pierden entre miles de productos.
Tianguis Digital CDMX	Enfocado en productos locales mexicanos.	Sin presencia en Xicotepec. No incluye la narrativa cultural del artesano.
IKAL (propuesta)	Especializado en bordados de Xicotepec. Historia del artesano integrada. Sin comisiones de intermediarios.	En desarrollo. Oportunidad: primer marketplace especializado en bordados de la sierra poblana. Fácil de utilizar.

FASE 2

DEFINIR

A. POV — Point of View (Punto de Vista)

"Las artesanas de Xicotepec de Juárez, Puebla, necesitan un canal digital directo para vender sus bordados al precio justo, porque la dependencia de intermediarios reduce sus ingresos entre un 40% y 60%, invisibiliza su trabajo y les impide construir una relación directa con sus compradores."

B. Análisis de viabilidad

Dimensión	Análisis para IKAL
Social	IKAL promueve la economía directa entre artesanas y compradores, eliminando intermediarios. Preserva la identidad cultural de Xicotepec y genera ingresos justos para las familias artesanas de la región serrana de Puebla.
Técnico	Viable mediante tecnologías web estándar: HTML, CSS y JavaScript para el frontend. Los dashboards de análisis de datos se construyeron en Power BI con datos generados por IA, dado que la conexión a base de datos real y pagos en línea corresponden a una fase posterior del proyecto
Financiero	Modelo autosustentable sin comisiones de intermediarios. Las artesanas reciben el 100% del precio de venta. El proyecto puede escalar con una pequeña comisión de plataforma en etapas futuras, manteniendo un precio justo y accesible para las artesanas.
Ambiental (ODS)	Alineado con ODS 8 (Trabajo decente), ODS 10 (Reducción de desigualdades) y ODS 11 (Comunidades sostenibles). Reduce la cadena logística y apoya el comercio local sostenible.

C. HMW — ¿Cómo podríamos...? (How Might We)

A partir del POV, el equipo generó las siguientes preguntas HMW como detonadores de ideación:

- ¿Cómo podríamos hacer que las artesanas publiquen sus bordados sin necesidad de conocimientos técnicos avanzados?
- ¿Cómo podríamos generar confianza entre compradores que no conocen a la artesana en persona?
- ¿Cómo podríamos hacer que cada compra se sienta como una conexión cultural, no solo una transacción?
- ¿Cómo podríamos facilitar los pagos en línea para compradores y artesanas en zonas con acceso limitado a bancos?
- ¿Cómo podríamos ayudar a las artesanas a contar la historia detrás de cada pieza?

FASE 3 IDEAR

A. Canvas de Propuesta de Valor

Socios Clave	Actividades clave	Valor	Relación con los clientes	Clientes
Artesanos locales: Son el corazón del proyecto. ONGs: Capacitan en comercio justo y gestión de negocios. Influencers y expertos en moda: Promocionan los productos en sus redes, permitiendo mayor visibilidad de la marca y de los productos de la región. Marcas de ropa: Distribuyen productos artesanales en sus líneas. Suministradores de materiales: Proveen insumos de calidad, de la región y sostenibles. Empresas de logística: Paqueterías encargadas de entregar los productos a los clientes. Marketing digital: Gestiona campañas publicitarias y redes sociales para lograr mayor alcance de clientes. Plataformas de pago: Encargadas de procesar transacciones en línea de forma segura.	- Investigación y análisis de las necesidades de artesanos y consumidores - Diseño y desarrollo del sitio web - Contratación, configuración y administración del hosting y dominio - Implementación de sistemas de pago seguro - Actualización semanal de productos - Promociones y contenido de la plataforma - Participación en ferias y eventos para exhibir los productos. - Gestión de pedidos y entrega de paquetes - Atención y soporte al cliente - Mantenimiento continuo del sistema Recursos clave Recursos Físicos - Servidores y hosting para la plataforma web - Equipos de cómputo y software - Talleres o espacios de trabajo para artesanos - Almacenes para inventario y productos terminados Recursos Intelectuales - Registro de las marcas - Conocimiento en realidad aumentada y en tipos de bordados Recursos Humanos - Administradores del proyecto - Desarrolladores web y diseñadores gráficos - Personal de atención al cliente Recursos Financieros - Fondos para desarrollo, materiales y gastos operativos	Modelo de Venta Directa: A diferencia de los modelos tradicionales que dependen de intermediarios, este proyecto permite a los artesanos vender directamente a los consumidores, aumentando sus márgenes de ganancia. Uso de Tecnología: La combinación de técnicas artesanales con tecnologías modernas es poco común en el mercado actual, lo que permite crear productos únicos que atraen a un público más amplio. Enfoque en Capacitación: Mientras que otros modelos pueden centrarse únicamente en la venta, este proyecto se enfoca en empoderar a los artesanos a través de la capacitación, asegurando su crecimiento a largo plazo. Compromiso con la Sostenibilidad: La propuesta se alinea con las tendencias actuales de consumo responsable, ofreciendo productos que no solo son únicos, sino que también son producidos de manera ética y sostenible. IKAL como marca propia incorpora Realidad Aumentada en sus productos, haciendo que los bordados cobren vida al escanearlos con un celular, ofreciendo una experiencia única y personalizada.	Para clientes (Compradores): - Atención proactiva a través de chat, email y redes para resolver dudas - Encuestas y opiniones para su experiencia - Programa de fidelización con puntos canjeables - Atención personalizada con los clientes Para los artesanos (vendedores): - Capacitación y asesoría en digitalización - Soporte técnico para su cuenta en el sitio	Para los artesanos (vendedores): Artesanos de comunidades como Xicotepec de Juárez y Pantepec, Puebla, que poseen habilidades tradicionales en la creación de productos artesanales como bordados y tejidos. Para clientes (Compradores): Consumidores nacionales e internacionales: Personas que valoran la autenticidad y el trabajo artesanal detrás de cada pieza. Adolescentes urbanos: Jóvenes que buscan productos con estilo contemporáneo, pero con historia y tradición. Turistas y coleccionistas: Personas que desean llevarse recuerdos únicos y auténticos, o coleccionar artesanías de diferentes culturas. Empresas y negocios de comercio justo: Organizaciones interesadas en asociarse con artesanos para distribuir productos que cumplan con principios éticos y ecológicos.
Costos - Desarrollo y mantenimiento de la plataforma web: \$30,000 MXN** (inicial) / **\$5,000 MXN (anual) - Costos de hosting, servidores y dominio: \$5,000 MXN (anual) - Inversión en seguridad digital y protección de datos: \$2,000 MXN (anual) - Marketing digital y estrategias de crecimiento en redes sociales: \$15,000 MXN (anual) - Salarios del personal clave (desarrolladores, diseñadores, marketing): \$120,000 MXN (anual) - Costos de materiales tradicionales (hilos, telas, tintes): \$200 MXN por unidad - Mano de obra artesanal y tecnológica: \$250 MXN por unidad - Costos de envío y almacenamiento de productos: \$100 MXN por unidad - Comisiones a plataformas de pago (Mercado Pago, PayPal): 2-3% por transacción - Capacitación y talleres para artesanos: \$10,000 MXN (anual)		Ingresos Los ingresos del proyecto se generarán principalmente a través de la venta de productos de la marca propia IKAL. Y para los artesanos se les cobrará una comisión mínima por venta, destinada únicamente a cubrir los gastos de hosting y mantenimiento de la plataforma.		

Ilustración 1 Modelo Canvas

B. Arquitectura de la solución — 4 Épicas

Épica	Nombre	Historias	Propósito
EP-1	Registro y Perfiles	HU-A01, A02, A03, A04	Que la artesana tenga identidad digital y el comprador pueda conocerla.
EP-2	Catálogo y Tienda	HU-B01, B02, B03, B04, B05	Que los bordados sean visibles, buscables y comprables fácilmente.
EP-3	Pagos y Pedidos	HU-C01, C02, C03, C04, C05	Que la transacción sea segura, trazable y sin intermediarios.
EP-4	Comunidad y Difusión	HU-D01, D02, D03, D04	Que cada bordado lleve la historia de quien lo hizo y llegue a más personas.

C. Stack tecnológico seleccionado

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	HTML + CSS + JavaScript	Tecnologías base accesibles para el equipo. Permiten crear interfaces responsivas sin frameworks complejos para el MVP.
Datos	Power BI	Visualización y control de datos.
Pagos	MercadoPago	Mayor cobertura en México. Soporta tarjeta, OXXO y SPEI. No almacena datos sensibles en la plataforma.

Control de versiones	GitHub	Repositorio compartido. Cada integrante trabaja de manera ordenada.
Gestión ágil	Jira (Scrum)	Backlog con 18 historias distribuidas en 3 sprints y 4 épicas. Tablero Kanban para seguimiento diario.

FASE 4 PROTOTIPAR

A. MVP Funcional — Avance actual

El equipo ha desarrollado las siguientes pantallas funcionales en HTML, CSS y JavaScript, disponibles en el repositorio de GitHub:

Historia	Pantalla	Estado	Responsable	Descripción
HU-B03	index.html — Inicio/Catálogo	Completada	M. del Rosario	Hero con productos destacados, filtros por categoría y buscador.
HU-A02	login.html — Inicio de sesión	Completada	M. del Rosario	Login con Google y correo. Diseño de dos columnas con propuesta de valor.
HU-B05	producto.html — Detalle	Completada	M. del Rosario	Galería, precio, descripción, artesana y botones de compartir.
HU-C01	carrito.html — Carrito	Completada	M. del Rosario	Carrito funcional con control de cantidades y totales.
HU-A01	registro.html — Registro	Completada	M. de los Ángeles	Formulario de registro con validación.
HU-C05	checkout.html — Envío	Completada	M. de los Ángeles	Formulario de dirección de envío.
HU-C02, C03	Pagos y gestión de pedidos	Completada	M. del Rosario	Integración de flujo de pago y panel de pedidos (Sprint 2).
HU-B04, C04, D01-D04	Búsqueda, rastreo y comunidad	En curso	Ángeles / Karla	Sprint 3 en ejecución: 3 de 6 historias completadas.
HU-B01	Publicar Producto	Completada	Karla	Pantalla que muestra el producto publicado.

B. Gestión ágil con Scrum en Jira

Sprint	Fechas	Épicas / Historias	Puntos	Estado
Sprint 1 Fundamentos	6 jul → 19 jul	EP-2: B03,B05,B01 · EP-1: A02,A01 · EP-3: C05,C01	17	Listo
Sprint 2 Pagos y Perfiles	20 jul → 2 ago	EP-3: C02,C03 · EP-1: A03,A04 · EP-2: B02	16	Listo
Sprint 3 Comunidad	3 ago → 14 ago	EP-2: B04 · EP-3: C04 · EP-4: D01,D02,D03,D04	15	En curso

FASE 5 EVALUAR

A. Métricas de desempeño del MVP

Métrica	Criterio de éxito	Cómo se mide
Usabilidad del catálogo	El comprador encuentra un bordado fácilmente.	Prueba de navegación con usuario externo.
Funcionalidad del login	El artesano puede iniciar sesión en menos de 1 minuto.	Cronómetro en prueba de usuario.
Seguridad del pago	Transacción procesada sin exponer datos de tarjeta.	Revisión de integración MercadoPago (tokenización).
Tiempo de carga	Cada página carga en menos de 5 segundos en conexión móvil.	Chrome DevTools.
Satisfacción de la artesana	La artesana puede publicar un bordado sin ayuda externa.	Prueba de usabilidad observada con artesana real.
Cobertura de historias	Las 18 historias de usuario completadas antes del 14 de agosto.	Tablero Jira — columna "Listo".

B. ODS relacionados con el proyecto

ODS	Nombre	Cómo IKAL contribuye
ODS 8	Trabajo decente y crecimiento económico	IKAL elimina intermediarios y garantiza que las artesanas reciban un ingreso justo, promoviendo el empleo digno en zonas rurales de Puebla.
ODS 10	Reducción de las desigualdades	Conecta directamente a artesanas de comunidades marginadas con compradores nacionales, reduciendo la brecha económica entre zonas rurales y urbanas.
ODS 11	Ciudades y comunidades sostenibles	Fortalece la economía local de Xicotepec y Pantepec, preservando las tradiciones artesanales como motor de desarrollo comunitario sostenible.

C. Pitch ejecutivo — Resultados esperados

"IKAL es capaz de eliminar hasta el 60% de las pérdidas por intermediación que enfrentan las artesanas de Xicotepec, conectándolas directamente con compradores de todo el país a través de una plataforma web accesible, segura y diseñada desde la empatía hacia su contexto cultural y económico."

- Las artesanas de Xicotepec pueden publicar y vender sus bordados directamente desde la plataforma.
- Los compradores pueden descubrir, filtrar y adquirir bordados auténticos con pago seguro.
- Cada artesana tiene un perfil público con su historia, técnica y portafolio de piezas.
- El ingreso de las artesanas aumenta al eliminar la cadena de intermediarios.
- La tradición bordada de Xicotepec y Pantepec gana visibilidad nacional.

GESTIÓN ÁGIL DEL PROYECTO — SCRUM

1. Visión y Priorización del Product Backlog (WSJF / ROI / MoSCoW)

Ecuación WSJF: $WSJF = \text{Costo de Demora (Valor Negocio + Criticidad Tiempo + Reducción Riesgo)} \div \text{Tamaño (Story Points)}$

Ecuación ROI: $ROI = \text{Valor de Negocio} \div \text{Tamaño (Story Points)}$

ID	Historia	MoSCoW	Valor	Crit.	Riesgo	CoD	Pts	WSJF	ROI	Sprint
HU-B03	Explorar catálogo	Must	9	6	4	19	2	9.50	4.50	S1
HU-B05	Ver detalle producto	Must	9	5	4	18	2	9.00	4.50	S1
HU-A02	Inicio de sesión	Must	7	7	5	19	2	9.50	3.50	S1
HU-C05	Dirección de envío	Must	7	4	3	14	2	7.00	3.50	S1
HU-B01	Publicar producto	Must	10	6	4	20	3	6.67	3.33	S1
HU-A01	Registro del artesano	Must	9	7	5	21	3	7.00	3.00	S1
HU-C01	Agregar al carrito	Must	8	5	4	17	3	5.67	2.67	S1
HU-C02	Pago seguro	Must	10	9	7	26	5	5.20	2.00	S2
HU-C03	Gestionar pedidos	Must	8	7	6	21	4	5.25	2.00	S2
HU-A04	Ver perfil artesano	Should	5	3	2	10	2	5.00	2.50	S2
HU-B02	Editar producto	Should	5	3	2	10	2	5.00	2.50	S2
HU-A03	Crear perfil público	Should	6	4	3	13	3	4.33	2.00	S2
HU-B04	Buscar y filtrar	Should	6	4	3	13	3	4.33	2.00	S3
HU-C04	Rastrear pedido	Should	6	3	3	12	3	4.00	2.00	S3
HU-D04	Reseñas	Should	5	2	2	9	3	3.00	1.67	S3
HU-D01	Historia del artesano	Could	4	2	1	7	2	3.50	2.00	S3
HU-D02	Compartir redes	Could	5	2	2	9	2	4.50	2.50	S3
HU-D03	Conoce artesanas	Could	4	2	1	7	2	3.50	2.00	S3

Clasificación MoSCoW y cumplimiento de la regla 50-60%:

Categoría	Historias	% del total
Must Have (9)	HU-A01,A02,B01,B03,B05,C01,C02,C03,C05	50%
Should Have (6)	HU-A03,A04,B02,B04,C04,D04	33%
Could Have (3)	HU-D01,D02,D03	17%

Justificación de la PO: los Must Have representan exactamente el 50% del backlog total, cumpliendo el límite de 50-60% establecido. Las historias con mayor WSJF (HU-B03, HU-A02, ambas 9.50) se priorizaron primero por su bajo esfuerzo y alto valor combinado, siendo la base de todo el flujo de usuario posterior.

2. Arquitectura del Sprint Backlog (Capacidad y Estimación)

Velocidad Establecida del Equipo: 15 Puntos de Historia (3 integrantes $\times$ 1.5 hrs/día = 4.5 hrs/día en equipo; 1 punto = 3 horas, sprint de 10 días hábiles).

Sprint 1 — Meta: *"Permitir que una artesana se registre, publique un producto e inicie sesión, y que un comprador explore el catálogo, vea el detalle y agregue al carrito con dirección de envío."* (17 pts, 113% capacidad teórica, el equipo se comprometió ligeramente por encima de su estimación, pero se completó el 100% del Sprint)

Desglose Atómico de Subtareas Técnicas (estimación Fibonacci):

HU-B03 (2 Pts / 6 hrs)

- T1: Maquetado de grid de productos con CSS (3 hrs) — Rosario
- T2: Lógica de filtros por categoría en JS (2 hrs) — Rosario
- T3: Conexión de datos de prueba (1 hr) — Rosario

HU-A02 (2 Pts / 6 hrs)

- T1: Formulario de login con validación (2 hrs) — Rosario
- T2: Lógica de autenticación y sesión (3 hrs) — Rosario
- T3: Bloqueo tras intentos fallidos (1 hr) — Rosario

HU-B01 (3 Pts / 9 hrs)

- T1: Formulario de publicación (4 hrs) — Ángeles
- T2: Carga de hasta 6 imágenes (3 hrs) — Ángeles
- T3: Validación de stock (2 hrs) — Ángeles

HU-C01 (3 Pts / 9 hrs)

- T1: Estado del carrito persistente (4 hrs) — Rosario
- T2: Control de cantidades (3 hrs) — Rosario
- T3: Cálculo de totales (2 hrs) — Rosario

3. Ejecución Técnica y Gestión en Jira (Plan de Acción / Control de Versiones)

A. Criterio de Terminado (Definition of Done — DoD)

1. El código cumple con los criterios de aceptación definidos en la historia.
2. La función fue probada manualmente en navegador sin errores visibles.
3. La rama de la historia fue fusionada (merge) hacia la rama main.
4. La Product Owner revisó y aceptó el resultado en Jira.

B. Estado actual del tablero Kanban (evidencia real)

Sprint	Por hacer	En curso	En revisión	Listo
Sprint 1	0	0	0	7 / 7
Sprint 2	0	0	0	5 / 5
Sprint 3 (activo)	0	1 (HU-C04)	2 (HU-D01, HU-D02)	3 (HU-B04, HU-D04, HU-D03)

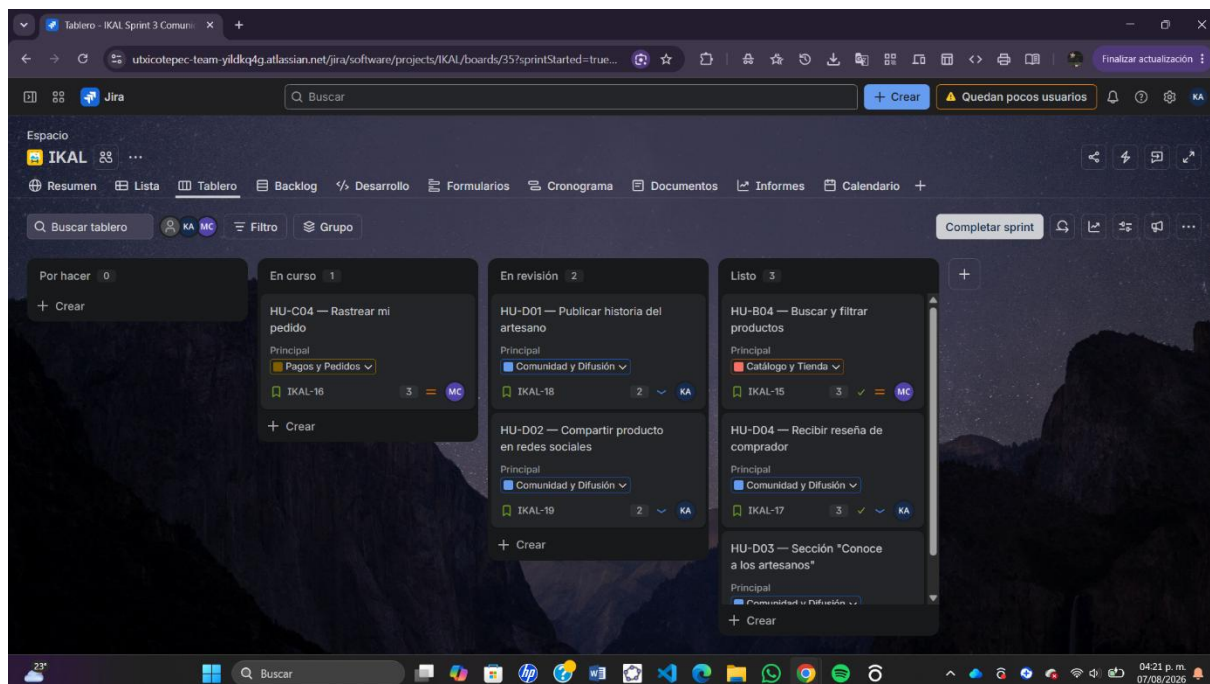


Ilustración 2 Panel de Jira

4. Gráficas de Control: Burndown Chart

Sprint 1 — Seguimiento diario (6 al 19 de julio, 10 días hábiles)

Día	Ideal (Pts)	Real Pendiente (Pts)	Evento / Notas
Día 1	17.0	17.0	Inicio del Sprint.
Día 2	15.3	17.0	Configuración del entorno de desarrollo local.
Día 3	13.6	15.0	HU-B03 completada (2 pts). Catálogo funcional.
Día 4	11.9	15.0	Bloqueo en HU-A02: conflicto de validación de sesión.
Día 5	10.2	11.0	Resuelto. HU-A02 y HU-B05 completadas (4 pts).
Día 6	8.5	9.0	HU-C05 completada (2 pts).
Día 7	6.8	6.0	HU-B01 completada (3 pts).
Día 8	5.1	3.0	HU-C01 completada (3 pts).
Día 9	3.4	0.0	HU-A01 completada (3 pts). Cierre técnico.
Día 10	0.0	0.0	Pruebas de aceptación con la PO. Sprint Exitoso: 17/17 pts.

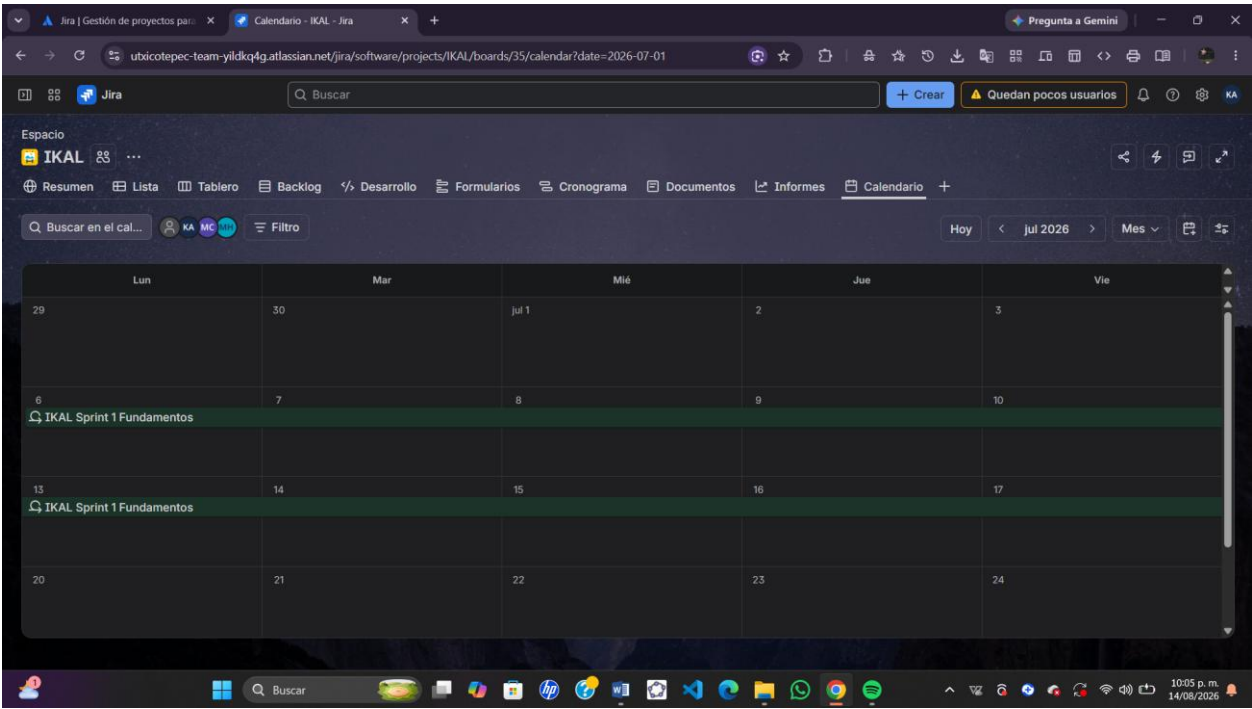


Ilustración 3 Burndown Chart del Sprint 1

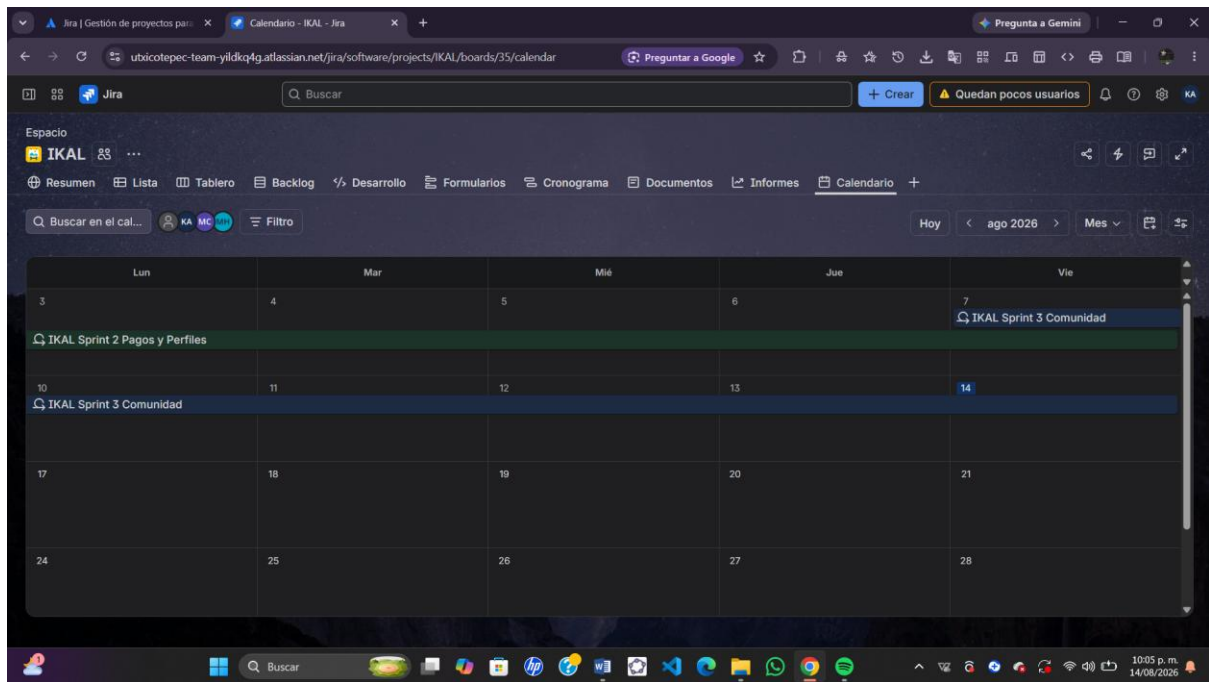


Ilustración 4 Burndown Chart de los Sprints 2 y 3

Análisis del Burndown Chart:

Durante el Día 4 se presentó un bloqueo por conflicto en la lógica de validación de sesión de HU-A02, identificado en la revisión diaria del equipo y resuelto reasignando apoyo entre integrantes. Esto permitió una caída sostenida del trabajo pendiente entre los días 5 y 9, cerrando el Sprint 1 con el 100% del compromiso planificado (17 de 17 puntos).

5. Incremento de Producto y Reporte de Revisión (Sprint Review)

Demostración del Incremento Funcional

- Entregable presentado: sitio web operable ejecutado en vivo en navegador durante la sesión de revisión.
 1. El catálogo muestra los productos con imagen, nombre, precio y artesana, con filtros funcionales por categoría.
 2. El usuario inicia sesión con correo y contraseña, mostrando error si las credenciales son incorrectas.
 3. Al seleccionar un producto se despliega el detalle con galería y botón para agregarlo al carrito.

ACTA DE ACEPTACIÓN DE HISTORIAS — SPRINTS 1, 2 y 3		
Sprint	Historias aceptadas	Puntos
Sprint 1	B03, B05, A02, C05, B01, A01, C01 (7 de 7)	17 / 17
Sprint 2	C02, C03, A04, B02, A03 (5 de 5)	16 / 16
Sprint 3 (en curso)	B04, D04, D03 aceptadas · D01, D02 en revisión · C04 en curso	8 / 15

VELOCIDAD PROMEDIO DEL EQUIPO: 16.5 puntos/sprint (Sprints 1 y 2 completados al 100%).

Retroalimentación para Refinamiento — cierre de Sprint 3

1. Feedback de la PO: priorizar el cierre de HU-C04 (en curso) y aprobar HU-D01/D02 (en revisión) antes de la fecha de entrega.
2. Acción inmediata: las 3 integrantes concentran esfuerzo en las 3 historias restantes del Sprint 3 en los días previos a la entrega final.
